

**Stato lavori ristrutturazione Cine OASIS**  
**Progetto “Santa Fé: rafforzamento dei servizi socio-culturali per lo sviluppo comunitario”**

**15 luglio 2013**

**Azione:** riqualificazione degli spazi del Cinema OASIS – Comunità di Santa Fé – Municipio Playa – la Habana

**Progetto Ristrutturazione:** Studio Architettonico ATRIO (cuba)

**Consulenza esterna progettazione:** Arch. Marta Niccolai

**Impresa Costruttrice:** ESEO – Impresa di Servizi ed Esecuzioni di Opere del MINCULT

**Costo previsto:** 83.000 Euro + 845.000 Pesos Cubani

**Avvio lavori:** 20 giugno 2013

**Termine previsto lavori:** 20 settembre 2013



**Vista esterna facciata: i lavori esterni saranno avviati al termine della ristrutturazione degli spazi interni**



**Vista palco. 20 maggio 2013.**



**Vista Palco. 15 luglio 2013**




**Vista opposta palco: galleria. 20 maggio 2013**



**Vista opposta palco: al posto della galleria è stata ricavata una saletta per mostre, incontri e attività con la comunità. 15 luglio 2013**



**Vista ingresso sala e galleria: 20 maggio 2013**

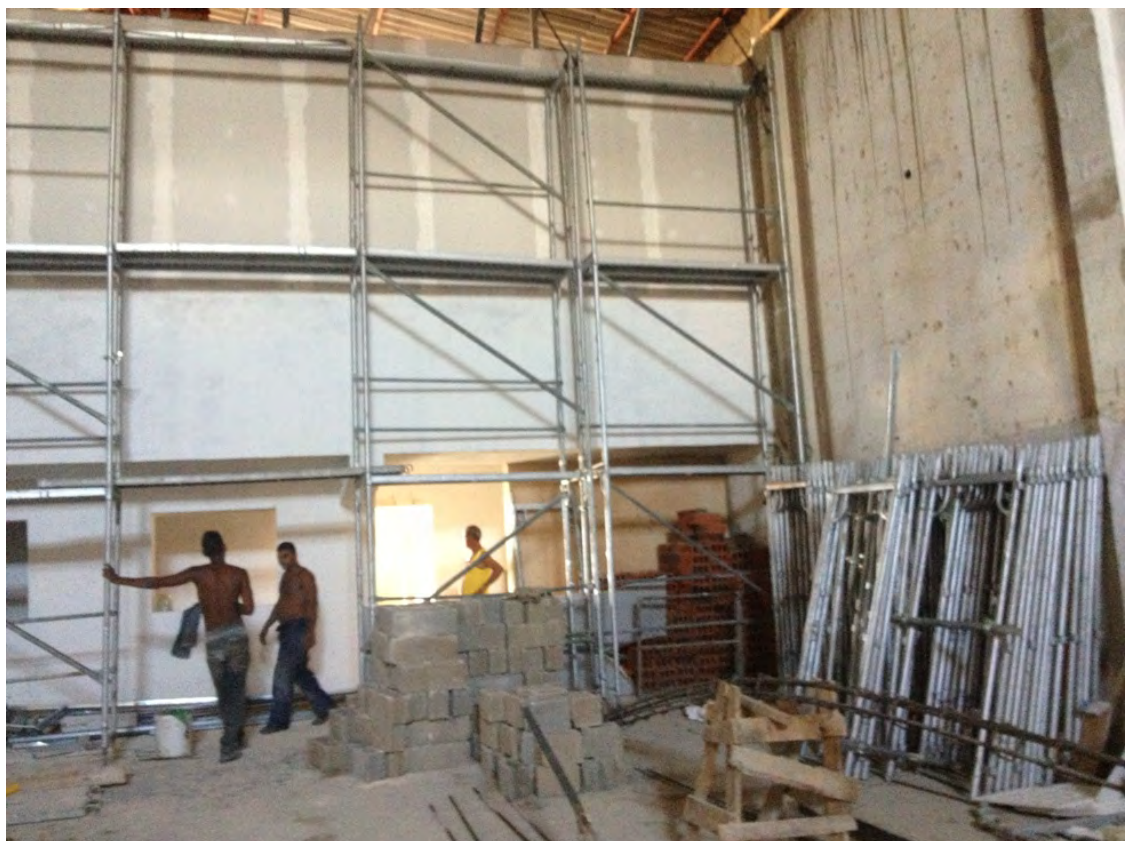

**Vista nuovo ingresso, alla sinistra la saletta per il video proiettore. 15 luglio 2013**



**Vista galleria. 20 maggio 2013**



**Vista galleria. La galleria è stata trasformata in una sala. 15 luglio 2013**



**Vista ingresso. 20 maggio 2013**



**Vista ingresso. 15 luglio 2013**
